


PROJETO
SAMU POA
15/09/23



TAREFAS

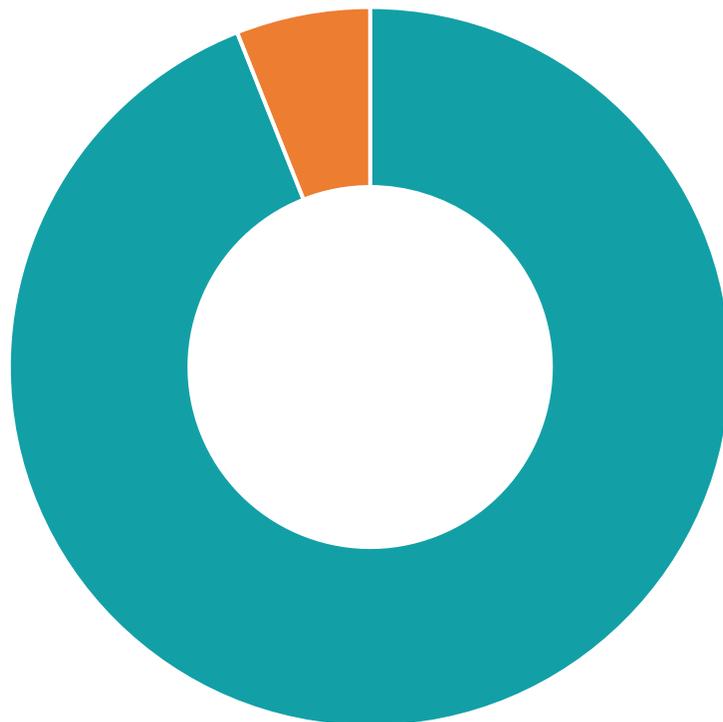

■ 94% concluído
■ 6% em andamento

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023

TÉRMINO ESTIMADO: 25/9/2023



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



08

MESES DE TRABALHO



94% CONCLUÍDO



79 DIAS DE ATRASO

A FAZER

Concluir os testes da Telefonia IP

Agendar a data da virada da
Telefonia

Acompanhamento da entrega




EM ANDAMENTO

Módulo Gestão de Urgências
(Previsão 25/09)

Testes Telefonia com a
PROCEMPA (previsão de
término 25/09)

Ativação de novas
funcionalidades da versão

Definição dos postos de
contingência (PROCEMPA)



CONCLUÍDO

Definição dos postos de
contingência ADM



ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO E POSTOS DE CONTINGÊNCIA

PRÓXIMOS PASSOS

Ajustar o escopo do despacho SEI: Indicar os postos de trabalho que terão o acesso ao SAPH dentro do processo.

14/09



PROCEMPA deverá enviar para a True os dados técnicos para a comunicação entre as redes.



True irá realizar as configurações



Realizar os testes e validar a comunicação. (True)

TESTES DE TELEFONIA IP

PRÓXIMOS PASSOS

Central foi configurada para testes, apresentando instabilidades na comunicação.



A True irá reconfigurar a comunicação.



15/09



PROCEMPA deverá validar a conectividade



O período de teste será retomado pela True



Previsão de uma semana de testes



Desenvolvimento da RDM pela True




Agendar a data da virada da Telefonia.




**SOLICITAÇÕES SAMU PORTO ALEGRE -
15/09/23**

TAREFA	TIPO	PRIORIDADE	STATUS	DATA DE INÍCIO	CONCLUSÃO	% CONCLUÍDO	OBSERVAÇÕES
Preenchimento automático do tipo de socorro presumido	Horas Mensal	Normal	Em andamento	06/07/2023	22/09/2023	<div style="width: 40%;"><div style="width: 40%;"></div></div> 40%	
Vídeo para Instrução do Despacho Rápido	Horas Mensal	Normal	Desenvolvimento	06/07/2023	15/09/2023	<div style="width: 90%;"><div style="width: 90%;"></div></div> 90%	Aguarda uma agenda para apresentação da proposta
Despacho PCR	Horas Mensal	Normal	Implantação	07/07/2023	05/09/2023	<div style="width: 90%;"><div style="width: 90%;"></div></div> 90%	Aguarda Dr. Fabiano autorizar para ir para produção
Comandos Smartphone por cerca eletrônica (Relatório de Qualidade Cerca Eletrônica)	Horas Mensal	Alta	Em andamento	04/09/2023	29/09/2023	<div style="width: 60%;"><div style="width: 60%;"></div></div> 60%	Relatório de Qualidade da Cerca está em fase de testes
Criação do tipo de socorro PCR	Horas Mensal	Normal	Produção/Concluído	06/07/2023	07/07/2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	✓
Logradouro autocompletado	Projeto	Normal	Produção/Concluído	11/08/2023	18/08/2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	✓
Retirar a obrigatoriedade COVID	Horas Mensal	Normal	Produção/Concluído	06/07/2023	10/07/2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	✓
Disponibilizar tipo de socorro PCR com e sem voluntário	Horas Mensal	Normal	Produção/Concluído	06/07/2023	07/07/2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	✓
Estudo BI - SAMU Porto Alegre	Horas Mensal	Normal	Desenvolvimento	01/07/2023	30/09/2023	<div style="width: 20%;"><div style="width: 20%;"></div></div> 20%	Aguarda agenda para apresentação da proposta
App True PCR - Migração do App True PCR para arquitetura atual	Horas Mensal	Normal	Desenvolvimento	01/08/2023	01/10/2023	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div> 50%	
App True PCR - Revisão da forma de comunicação centralx aparelho FCM	Horas Mensal	Normal	Desenvolvimento	01/08/2023	01/10/2023	<div style="width: 60%;"><div style="width: 60%;"></div></div> 60%	
Manutenção do aplicativo nas lojas Google e Apple	Horas Mensal	Normal	Desenvolvimento	01/07/2023	31/12/2023	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div> 50%	
Adequação de novas políticas de segurança Google/ Apple	Horas Mensal	Normal	Desenvolvimento	08/08/2023	10/10/2023	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div> 50%	
Ajustes Moodle	Projeto	Normal	Implantação	08/09/2023	15/09/2023	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div> 50%	Aguarda agenda para apresentação da proposta
Testes de Telefonia	Projeto	Alta	Desenvolvimento	01/09/2023	25/09/2023	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div> 50%	

- PENDÊNCIAS DE HARDWARE -

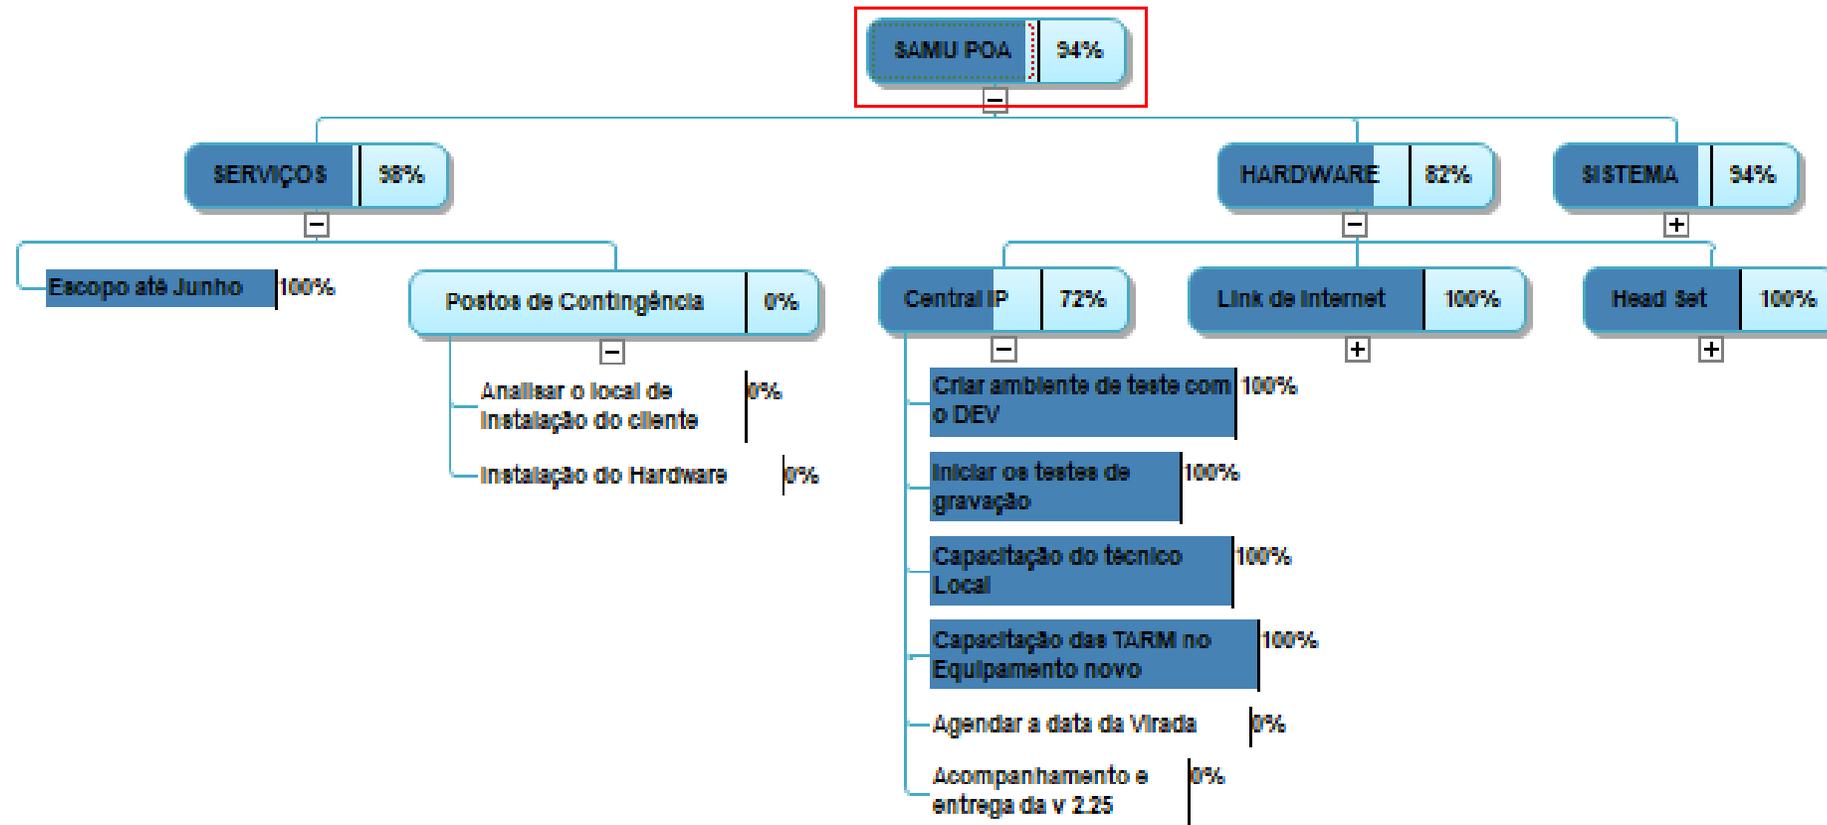

- PENDÊNCIAS DE SISTEMA -

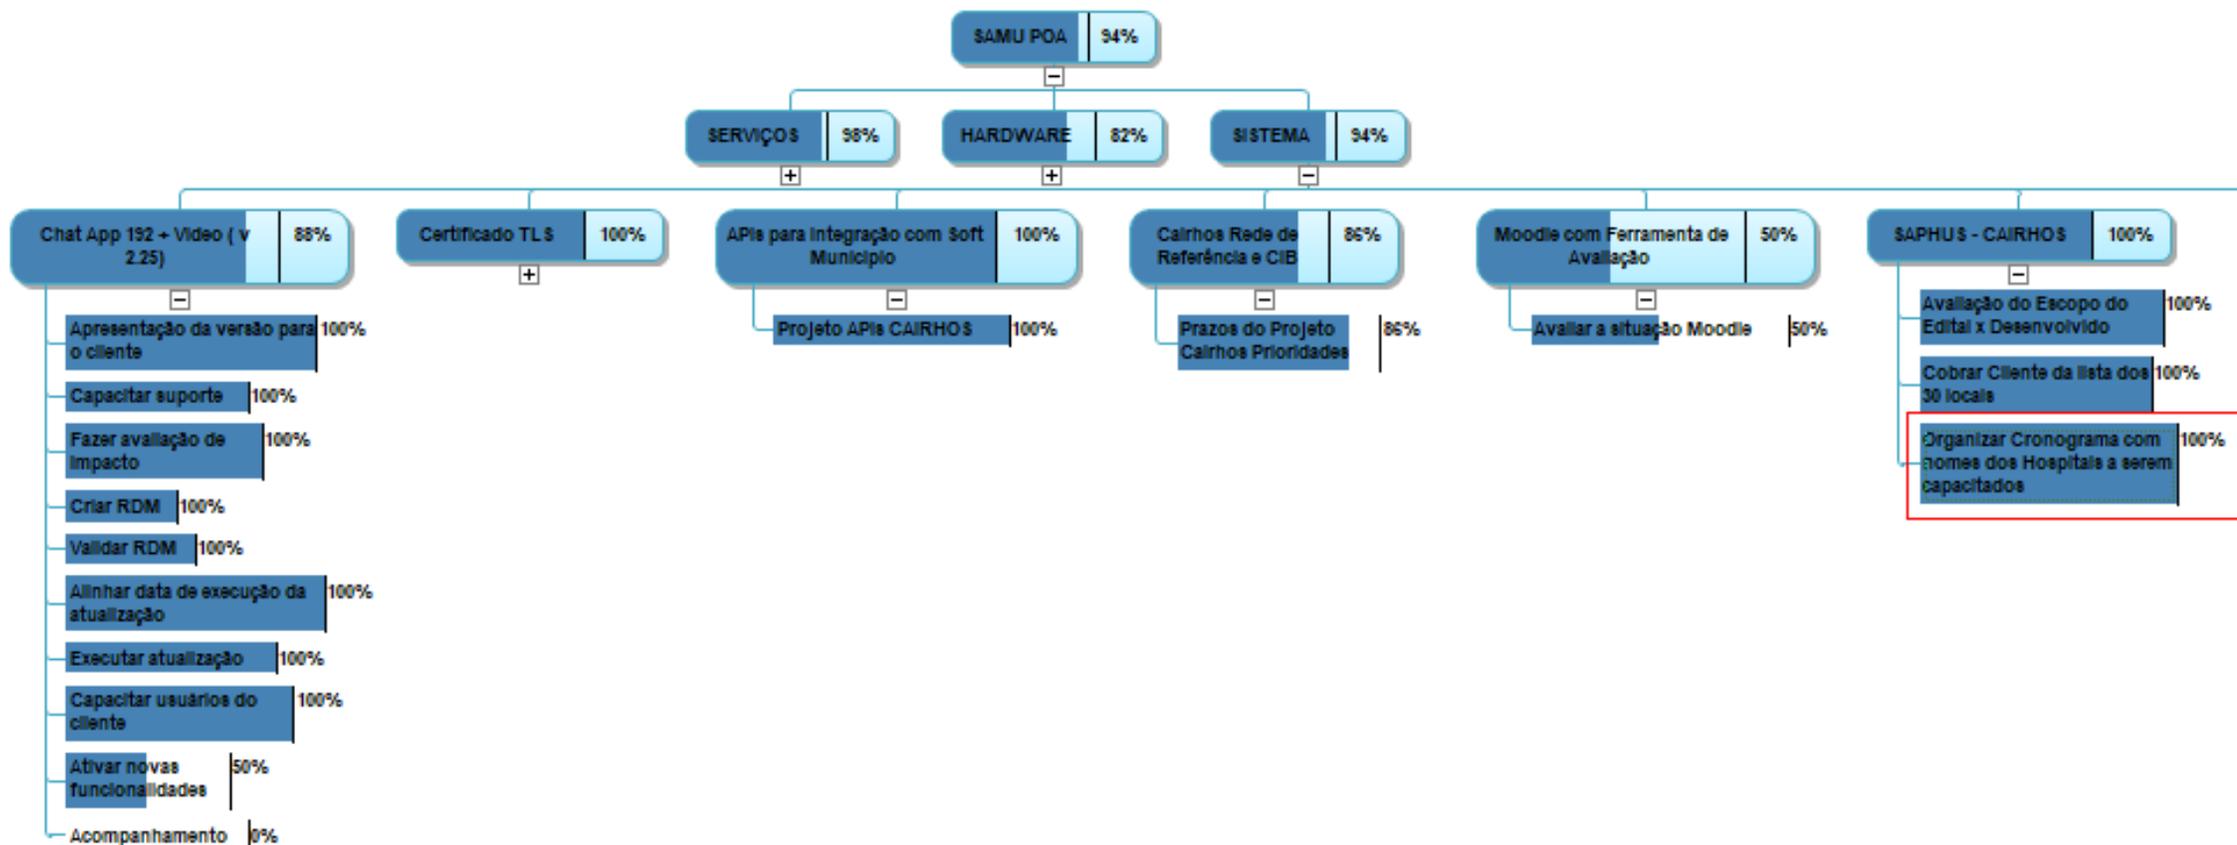

 **TRUE**
