


PROJETO
SAMU POA
22/09/23



TAREFAS

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023 | TÉRMINO ESTIMADO: 25/9/2023

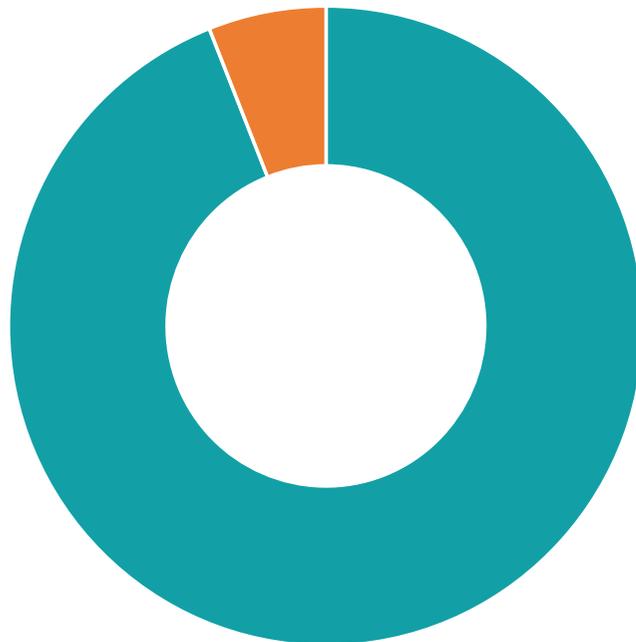

■ 94% concluído
■ 6% em andamento



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



08

MESES DE TRABALHO



94% CONCLUÍDO




86 DIAS DE ATRASO

A FAZER

Concluir os testes da Telefonia IP

Agendar a data da virada da Telefonia

Acompanhamento da entrega



EM ANDAMENTO

Módulo Gestão de Urgências
(Previsão 25/09)

Testes Telefonia com a PROCEMPA (previsão
de término 25/09)


Ativação de novas funcionalidades da versão
(finalização)

Ajustes Áudio Plataforma EAD
(29/9)

Instalação Postos de Contingência
(PROCEMPA)

Instalação acessos ADM ao SAPH (Aguarda
PROCEMPA)

Inserção do Gabarito Saúde Mental no EAD
(Aguarda Envio)



CONCLUÍDO

Definição dos postos de
contingência ADM



ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO E POSTOS DE CONTINGÊNCIA

PRÓXIMOS PASSOS

Ajustar o escopo do despacho SEI: Indicar os postos de trabalho que terão o acesso ao SAPH dentro do processo.



PROCEMPA deverá enviar para a True os dados técnicos para a comunicação entre as redes.



True irá realizar as configurações



Realizar os testes e validar a comunicação. (True)

Estamos aguardando a resposta no Processo SEI

TESTES DE TELEFONIA IP

PRÓXIMOS PASSOS

Central foi configurada para testes, apresentando instabilidades na comunicação.



A True irá reconfigurar a comunicação.



15/09



PROCEMPA deverá validar a conectividade



O período de teste será retomado pela True



Previsão de uma semana de testes



Desenvolvimento da RDM pela True




Agendar a data da virada da Telefonia.




SOLICITAÇÕES SAMU PORTO ALEGRE - 22/09/23

TAREFA	TIPO	PRIORIDAD	STATUS	DATA DE INÍCIO	CONCLUSÃO	% CONCLUÍDO	OBSERVAÇÕES
Preenchimento automático do tipo de socorro presumido	Horas Mensal	Normal	Concluído	06/07/2023	22/09/2023	100%	✓ Conforme ata enviada em 21/09
Vídeo para Instrução do Despacho Rápido	Horas Mensal	Normal	Implantação	06/07/2023	15/09/2023	90%	Aguarda Dr. Fabiano autorizar para ir para produção, conforme ata enviada em 21/09
Despacho PCR	Horas Mensal	Normal	Implantação	07/07/2023	05/09/2023	90%	Aguarda Dr. Fabiano autorizar para ir para produção
Comandos Smartphone por cerca eletrônica (Relatório de Qualidade Cerca Eletrônica)	Horas Mensal	Alta	Em andamento	04/09/2023	29/09/2023	60%	Relatório de Qualidade da Cerca está em fase de testes
Criação do tipo de socorro PCR	Horas Mensal	Normal	Produção/Concluído	06/07/2023	07/07/2023	100%	✓
Logradouro autocompletado	Projeto	Normal	Produção/Concluído	11/08/2023	18/08/2023	100%	✓
Retirar a obrigatoriedade COVID	Horas Mensal	Normal	Produção/Concluído	06/07/2023	10/07/2023	100%	✓
Disponibilizar tipo de socorro PCR com e sem voluntário	Horas Mensal	Normal	Produção/Concluído	06/07/2023	07/07/2023	100%	✓
Estudo BI - SAMU Porto Alegre	Horas Mensal	Normal	Concluído	01/07/2023	30/09/2023	100%	✓ Aguarda agenda para apresentação da proposta
App True PCR - Migração do App True PCR para arquitetura atual	Horas Mensal	Normal	Desenvolvimento	01/08/2023	01/10/2023	75%	
App True PCR - Revisão da forma de comunicação centralx aparelho FCM	Horas Mensal	Normal	Concluído	01/08/2023	01/10/2023	100%	✓
Manutenção do aplicativo nas lojas Google e Apple	Horas Mensal	Normal	Desenvolvimento	01/07/2023	31/12/2023	50%	
Adequação de novas políticas de segurança Google/ Apple	Horas Mensal	Normal	Desenvolvimento	08/08/2023	10/10/2023	50%	
Ajustes Moodle	Projeto	Normal	Implantação	08/09/2023	29/09/2023	75%	Finalizar ajustes no áudio até dia 29. Incluir Gabarito SAUDE MENTAL (Ana Stein)
Testes de Telefonia	Projeto	Alta	Desenvolvimento	01/09/2023	25/09/2023	50%	
Análise BI SAMU POA - 24h	Horas Mensal	Normal	Em andamento	21/09/2023	26/09/2023	25%	Elaborar plano de execução

- PENDÊNCIAS DE HARDWARE -

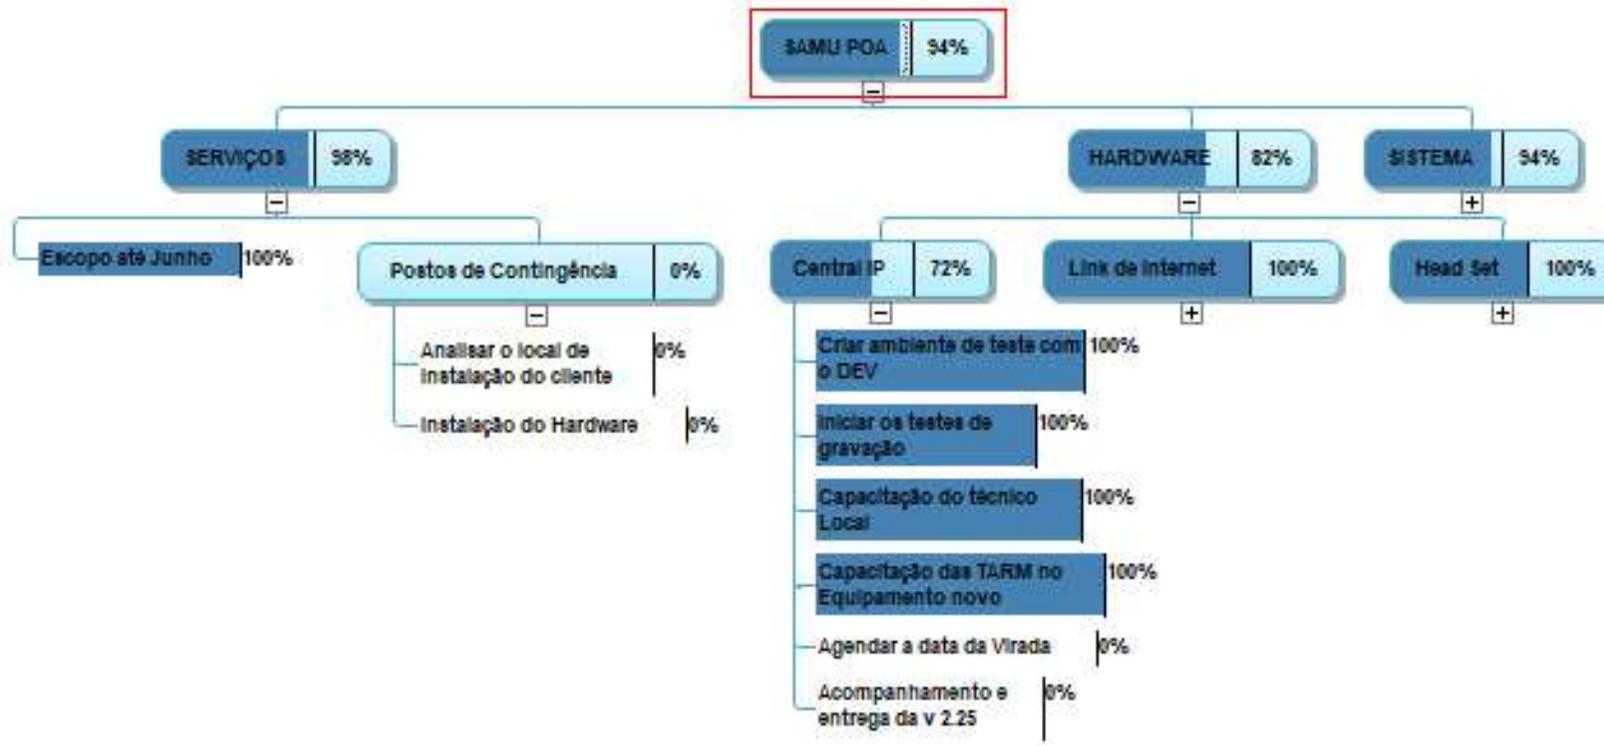

- PENDÊNCIAS DE SISTEMA -

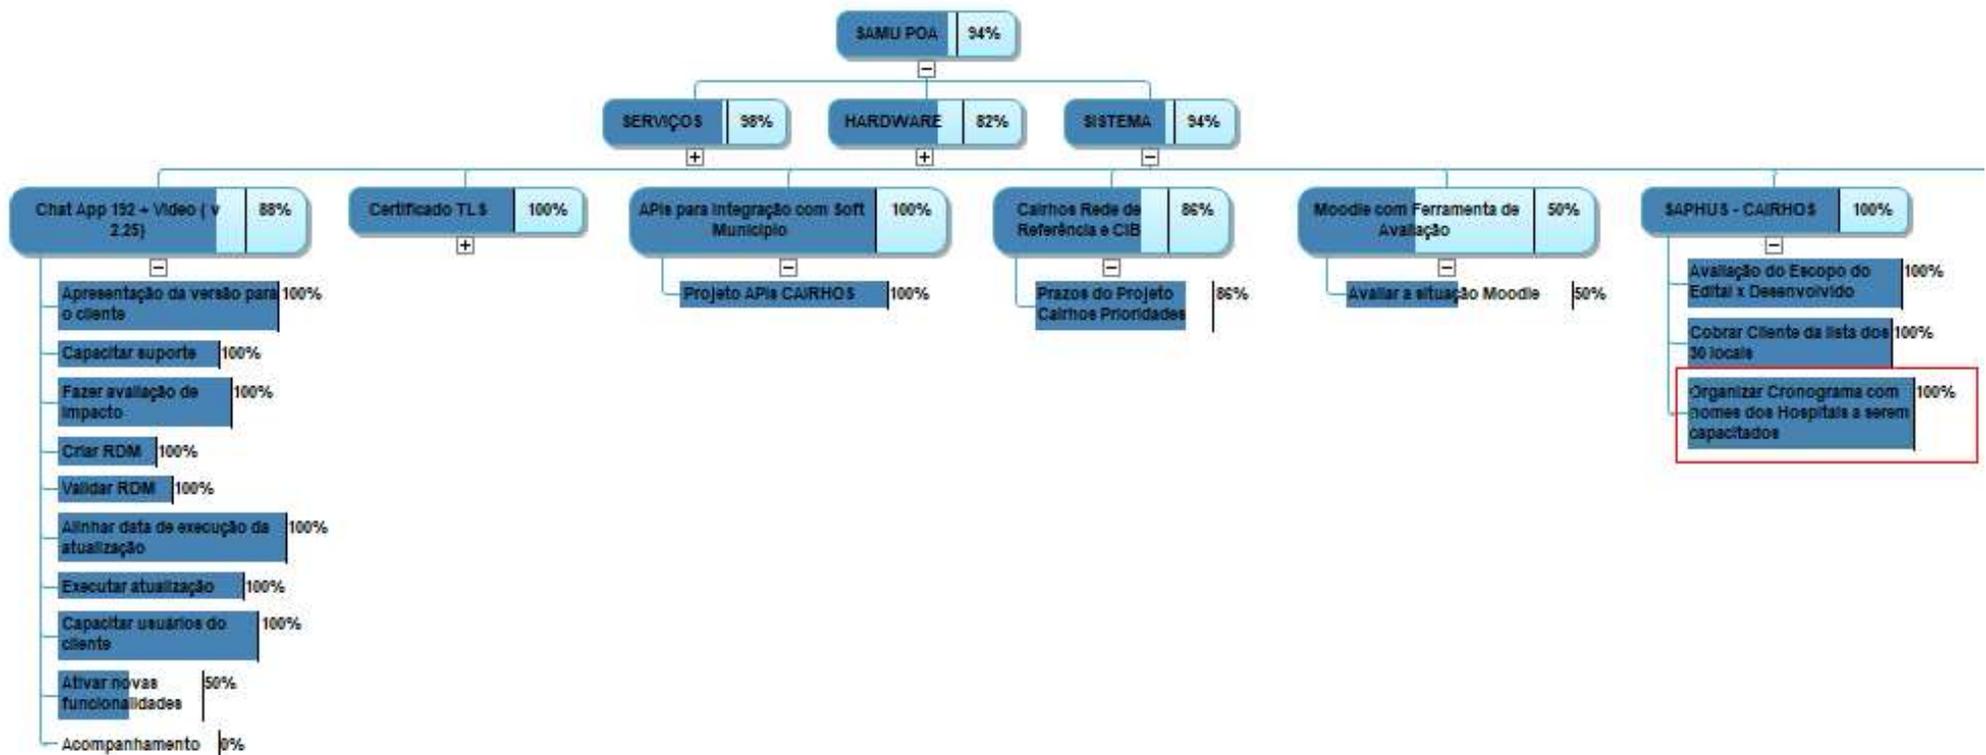

 **TRUE**
